


STAND ENDE OKTOBER

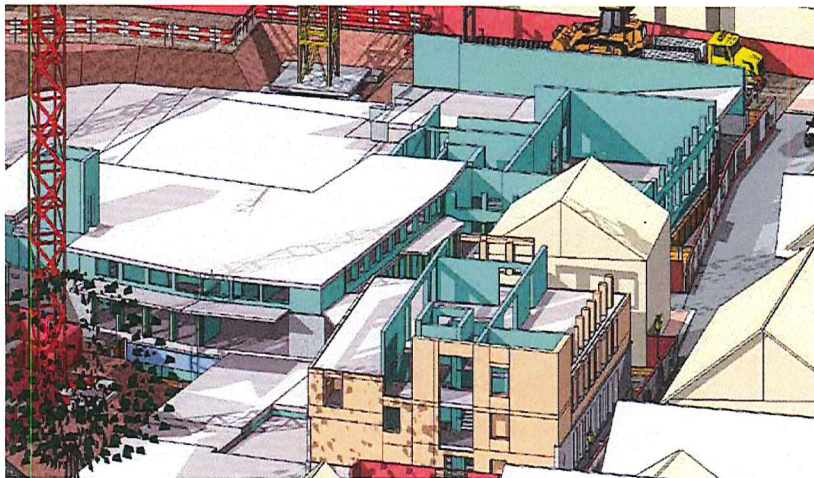

MONATLICHE BAUFORTSCHRITTE

Da wächst was in die Höhe

Wer ab und zu einen Blick auf die Baustelle «Gemeinde- und Kulturzentrum Mels» wirft, staunt ob dem Tempo, mit dem die neuen Bauten Gestalt annehmen. Die Betonarbeiten kommen gut voran, die Erdgeschosse von GKZ und Rathaus-Erweiterungsbau wachsen in die Höhe. Visualisierungen von Bauleiter Rolf Bless lassen uns einen Blick in die Zukunft werfen und führen die Bauziele für die drei Monate Oktober, November und Dezember vor Augen.

Nach Abschluss der umfangreichen Ausubarbeiten und Baugrubensicherungen konnte im Mai mit den Betonarbeiten begonnen werden. In den letzten gut fünf Monaten sind die Kellergeschosse und grosse Teile des Erdgeschosses der vier Teilprojekte (Kultursaal mit Tiefgarage, Rathaus-Erweiterung, Kellerei der Weinbaugenossenschaft sowie zweites Tiefgaragengeschoss von Daniel Ackermann) vollendet worden. Bis Ende Jahr sollen die Baumeisterarbeiten abgeschlossen werden können, wie auch die drei Visualisierungen vor Augen


führen. So ist geplant, das Rathaus noch dieses Jahr mit einem Dach zu versehen und aufzurichten. Beim Kultursaal wird ab Anfang 2019 mit dem Holzfachwerk begonnen. Die Aufriechung ist für Frühjahr 2019 vorgesehen. Alsdann kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Mit diesem Zeitprogramm können die Arbeiten vor vorgesehen ausgeführt werden. Bauleiter Rolf Bless hat für Sie die Bauziele für die Monate Oktober (oben), November (rechts oben) und Dezember am PC sichtbar werden lassen.




«Die Arbeiten auf der Baustelle kommen wirklich gut voran.»

ROLF BLESS, BAULEITER

STAND ENDE NOVEMBER

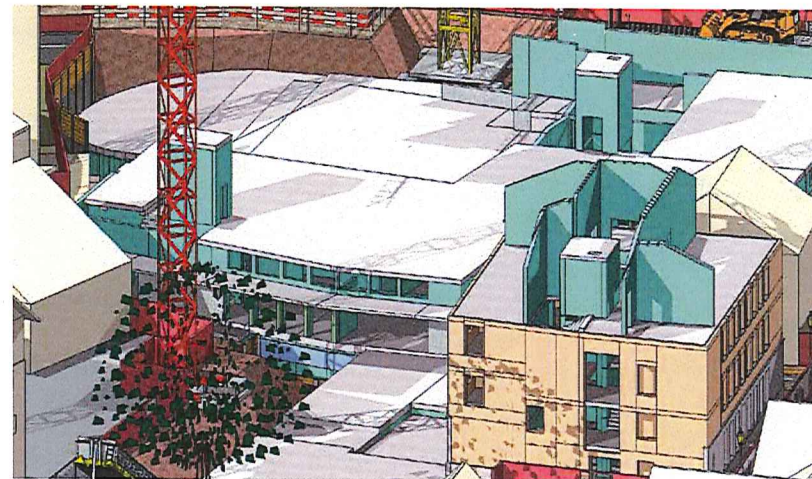

STAND ENDE DEZEMBER

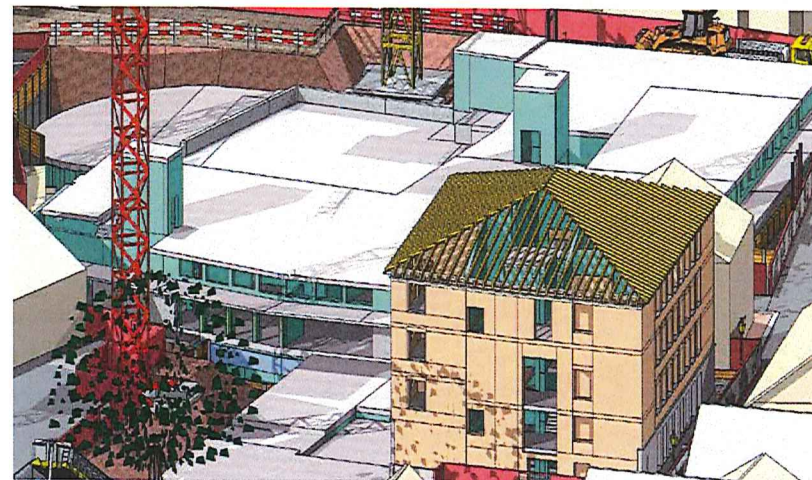

Monat für Monat grosse Fortschritte: Man hofft, die Baumeisterarbeiten bis Ende Jahr beenden zu können, das Rathaus soll bis dann ein Dach erhalten (unten, Stand Dezember), das Holzfachwerk des Kultursaals Anfang 2019 in Angriff genommen werden.
