



STAND ENDE DEZEMBER

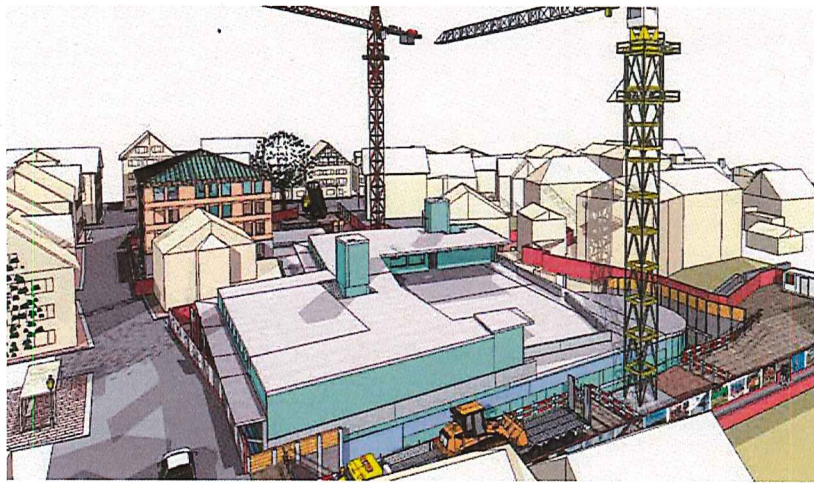

STAND ENDE FEBRUAR

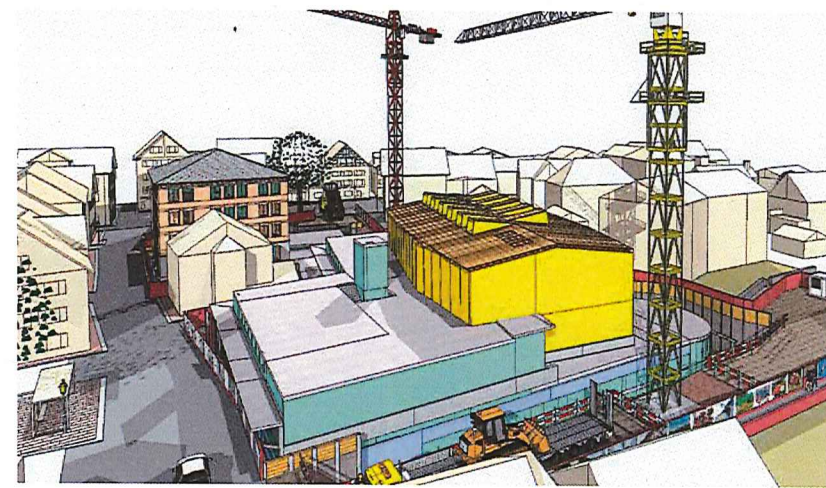

MONATLICHE BAUFORTSCHRITTE

## Petrus half mit

Auf der Baustelle «Gemeinde- und Kulturzentrum Mels» geht es weiterhin zügig voran. Bis Ende Jahr sollten die Baumeisterarbeiten abgeschlossen und das Rathaus mit einem Dach versehen sein. Visualisierungen von Bauleiter Rolf Bless lassen uns einen Blick in die Zukunft werfen und führen die Bauziele für die drei Monate Dezember, Februar und März vor Augen.

Gemeinderat Armin Bärtsch, Ressortleiter Bau und Verkehr, ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Gang der Arbeiten. Projekt- und Bauleitung, Architektenteam und alle beteiligten Bauarbeiter hätten bis anhin einen tollen Job gemacht. Auch wenn nicht zuletzt der liebe Petrus ebenfalls ein wenig zum heutigen Baustand beigetragen habe. «Er meinte es gut mit uns.» Bis heute seien alle Zielvorgaben eingehalten worden, erklärt Bärtsch, die Baumeisterarbeiten stünden kurz vor ihrem Abschluss, es fehlten nur noch wenige Fertig-

stellungsarbeiten. «Der Dachstuhl des neuen Rathauses wird bis Weihnachten aufgerichtet und abgedichtet sein», ergänzt Bärtsch. Im Februar wolle man mit dem Holzbau des Saalbaus beginnen, welcher sich dann bis in den Mai hineinziehen werde. Das Aufrichtefest ist auf den 16. Mai terminiert.


Parallel dazu laufen ab Januar beim Rathaus die Spengler- und Eindeckungsarbeiten und ab Februar werden Innenausbau, Fenster, Lüftung, Technik, Malerarbeiten, Aufzug usw. in Angriff genommen.



«Allen am Bau Beteiligten gebührt ein grosses Lob.»

ARMIN BÄRTSCH, GEMEINDERAT

STAND ENDE MÄRZ

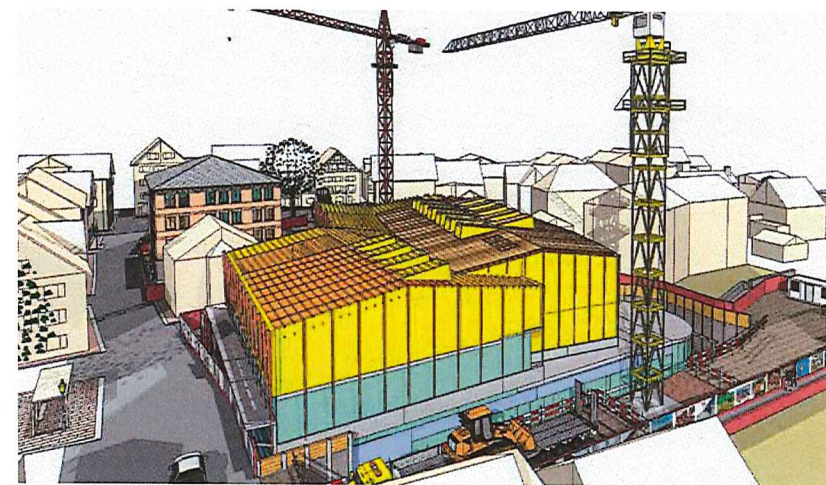

Monat für Monat grosse Fortschritte: Das Holzfachwerk des Kultursaals soll Anfang 2019 in Angriff genommen werden (oben links) – dann nimmt das Gemeinde- und Kulturzentrum nach und nach Gestalt an.
